



TOP 6: Erweiterung der Grundschule Vörden, hier: Vorstellung der aktuellen Planung durch das Büro IBR

- ▶ Vorentwurf zur Schulerweiterung auf Zweieinhalbzügigkeit am 03.12.2018 in der Schulausschusssitzung vorgestellt.
- ▶ 18.12.2018 Ratsbeschluss, dass auf Basis dieses Vorentwurfs die Schulerweiterung erfolgen soll
- ▶ Prüfung, ob EU-Weite Vergabe der Planungsleistungen erforderlich ist
- ▶ Nach Abschluss der Prüfung nationale Vergabe
- ▶ Vergabe der Objektplanung im Juni 2019 an das Büro IBR GmbH
- ▶ Vergabe Tragwerksplanung im September 2019
- ▶ Vergabe Fachplanungen für Technische Ausrüstung und Brandschutz im Oktober 2019


TOP 6: Erweiterung der Grundschule Vörden, hier: Vorstellung der aktuellen Planung durch das Büro IBR

- ▶ Überarbeitung des Planentwurfs in Abstimmung u.a. mit Schulvertretern und Brandschutzplaner durch das Büro IBR GmbH
- ▶ 18.02.2020 Vorstellung der Pläne im Arbeitskreis Schulerweiterung
- ▶ Für folgende diskutierte Planänderungen sollen noch Kosten ermittelt werden
 - ▶ Umgestaltung Verwaltungstrakt, Verlegung Stuhllager
 - ▶ Baulicher Versatz im Anbau „gerade“ ziehen
 - ▶ Nutzbarkeit des Rettungsbalkons
- ▶ Endgültige Entscheidung erst nach Vorlage der Kosten durch VA und RAT



Grundrisse Anbau in Richtung Aue

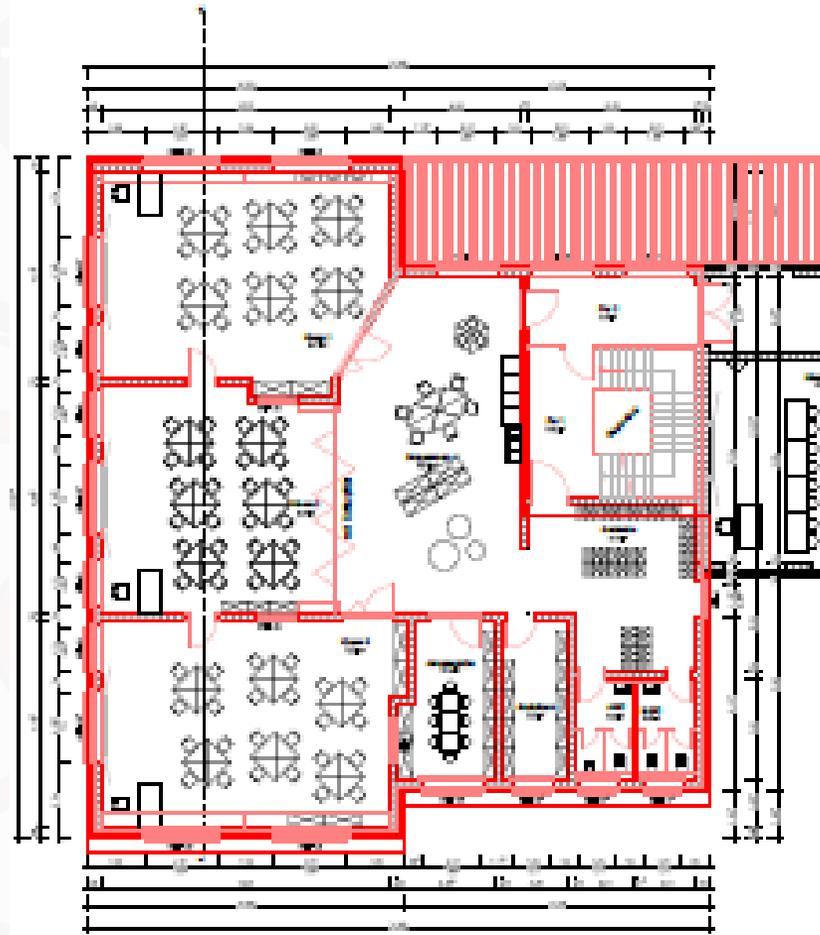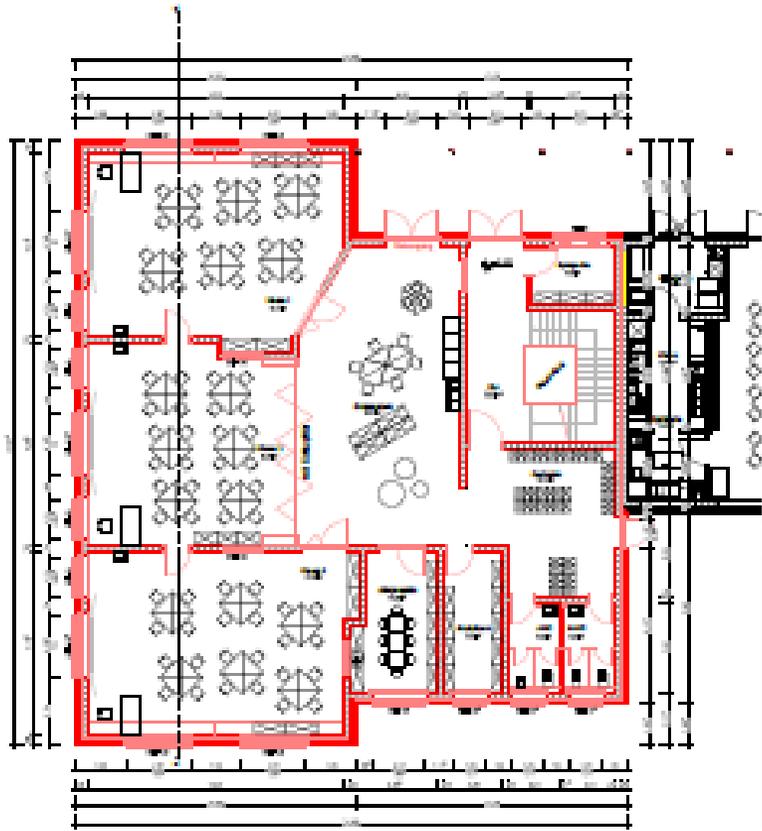

Grundrisse Altbau Schulstraße

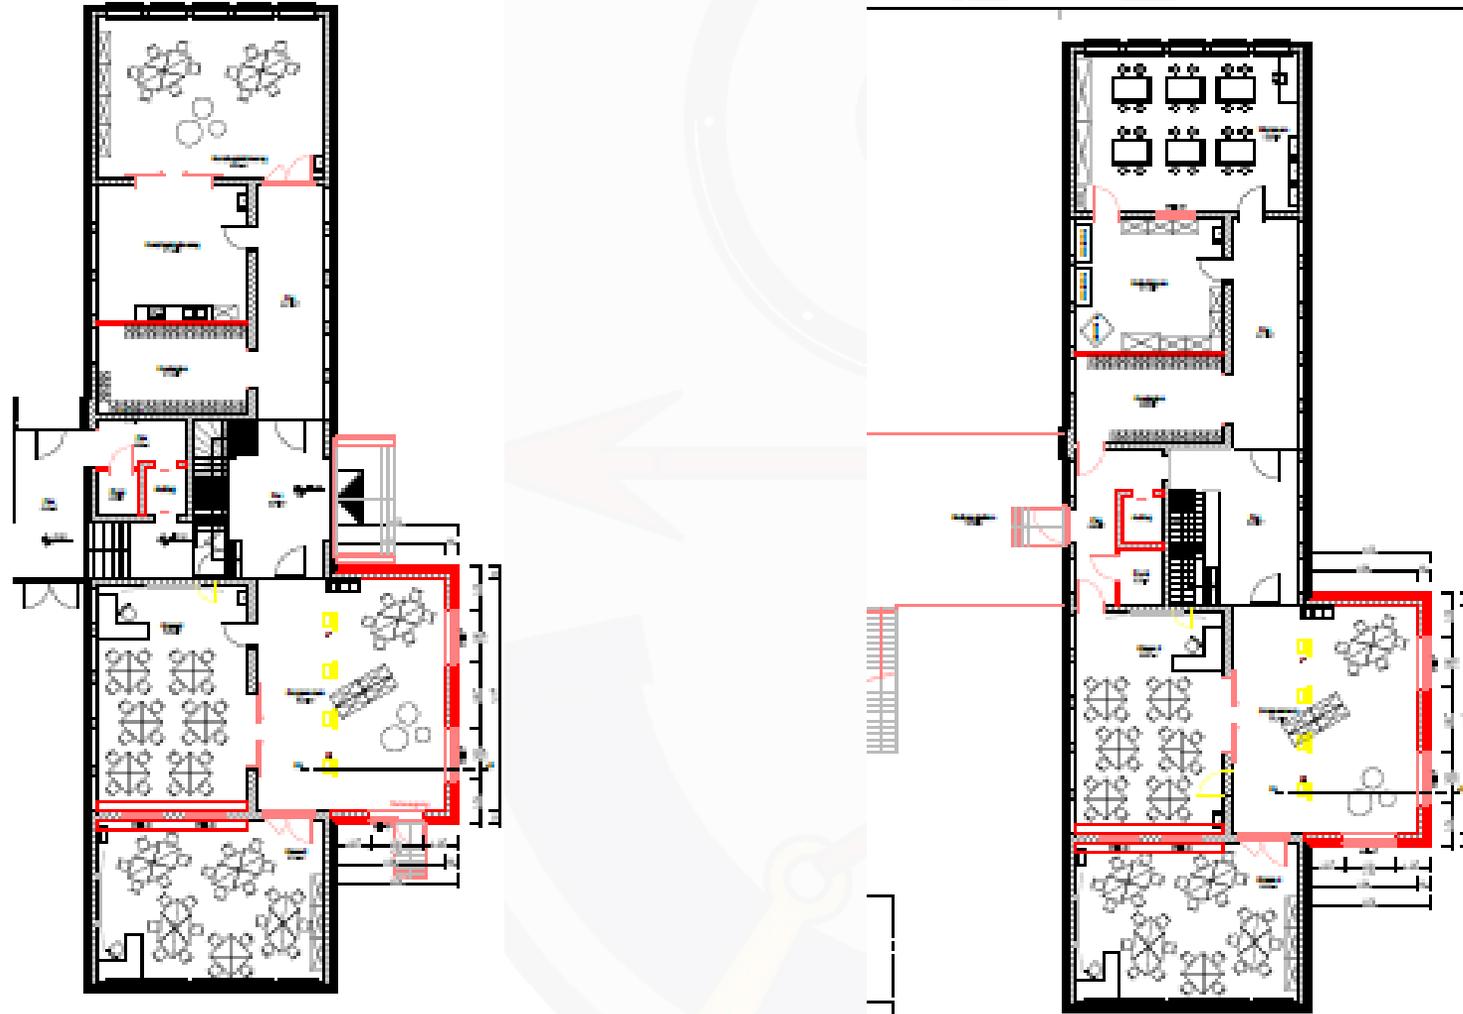

Grundrisse Mitteltrakt

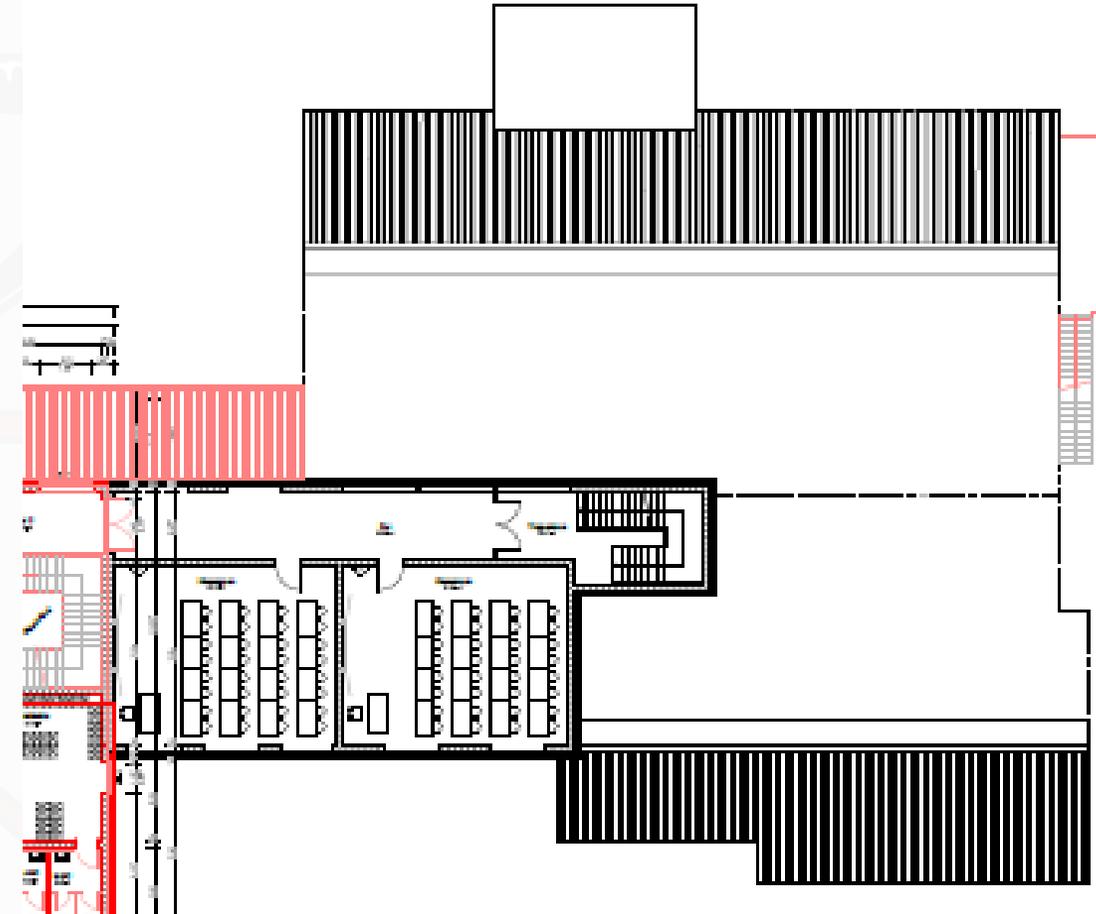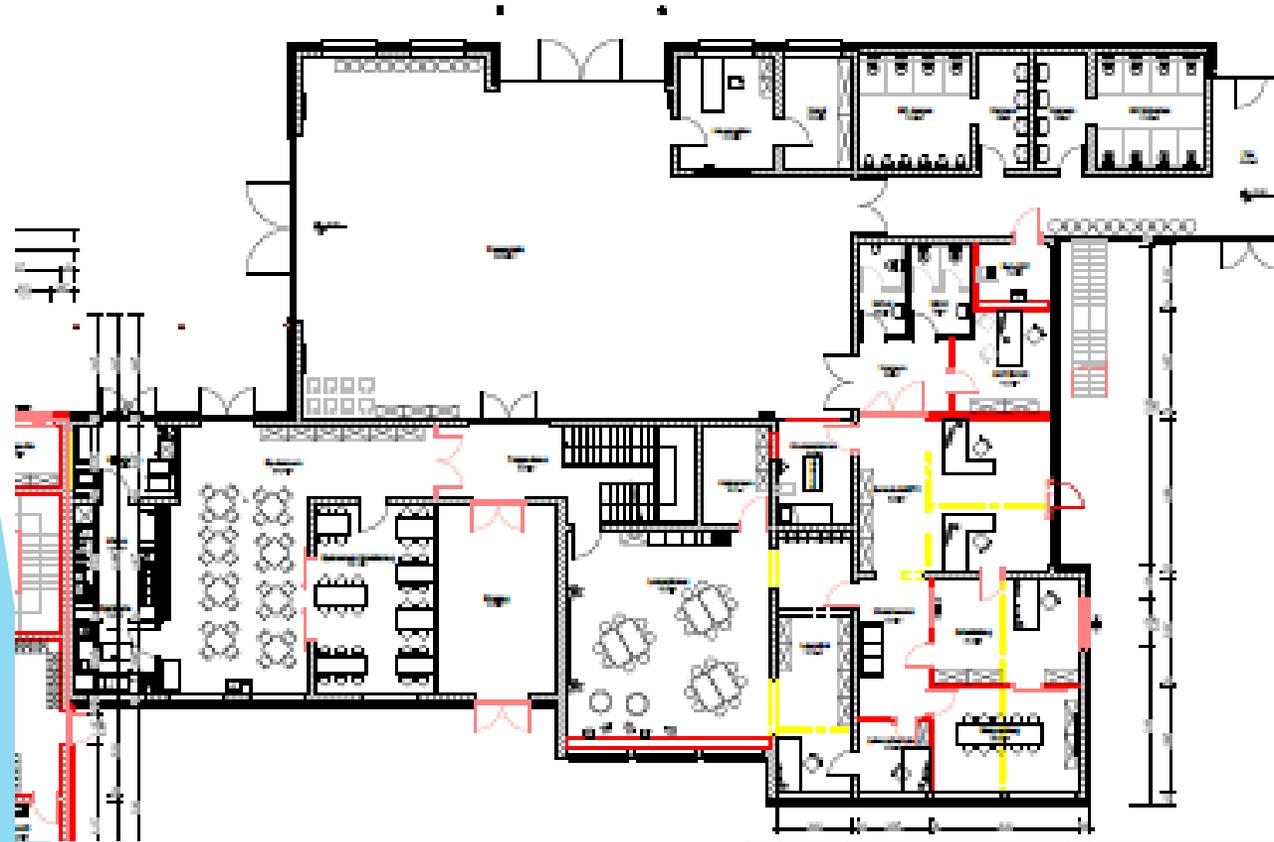

Ansicht von der Osnabrücker Straße

Ansicht von Süd-Osten



Ansicht von der Sporthalle

ANSICHT VON NORD-WESTEN



Ansicht Schulstraße

Ansicht von Nord-Osten



Ansicht von der Aue

Ansicht von Süd-Westen



TOP 6: Erweiterung der Grundschule Vörden, hier: Vorstellung der aktuellen Planung durch das Büro IBR

- ▶ Kosten:
- ▶ Aktuelle Kostenschätzung: 2.319.210 €
- ▶ Somit Kostensteigerung seit 2018: 364.000 €, davon aufgrund von
- ▶ Allgemeinen Preissteigerungen: 136.000 €
- ▶ Brandschutz Bestand: 82.000 €
- ▶ Planänderungen: 146.000 €

TOP 6: Erweiterung der Grundschule Vörden, hier: Vorstellung der aktuellen Planung durch das Büro IBR

Aktuelle Kostenschätzung:	2.319.210 €
▶ Kostensteigerungen für Planänderungen:	146.000 €
▶ Erweiterungsbau:	
▶ Mobile Trennwände und Sichtachsen	36.000 €
▶ Gebäudeecken begradigen	20.000 €
▶ Bereich Altbau:	
▶ Größerer Wanddurchbruch	14.000 €
▶ Bereich jetziger Neubau:	
▶ Größerer Wanddurchbruch Mensa	7.000 €
▶ Umgestaltung Lehrerbereich	50.000 €
▶ Umgestaltung Klassenräume:	19.000 €
▶ Optional: Lehrerzimmer Durchbruch Lehrmittel	5.000 €
▶ Optional: Durchbruch Klassenräume OG	10.000 €
